

III.3 Transport et élimination des terres et des bétons

Les terres ont été transportées à partir du site en semi bennes TP affrétées par SITA Remediation pour le transport entre du 12 et le 24 octobre 2012.

Les camions d'une capacité de 24 tonnes étaient bâchés selon la réglementation en vigueur.

Chaque transport a été accompagné du certificat d'acceptation. Le technicien de SITA Remediation a tenu un registre des évacuations de terres.

Les camions ont été pesés à l'entrée de la filière.

Dans le cadre des travaux de dépollution, SITA Remediation a dirigé les terres vers la plateforme multimodal de SITA FD de VILLEPARISIS (77).

Une copie des bons de pesée figurent en **annexe 5**.

Au total 1184,86 tonnes ont été évacuées en plateforme multimodale de SITA FD.

III.4 Réception des parois et fond fouille

Des prélèvements ont été réalisés en paroi et fond de la fouille avant remblaiement.

Les analyses ont portés sur les paramètres HCT et BTEX.

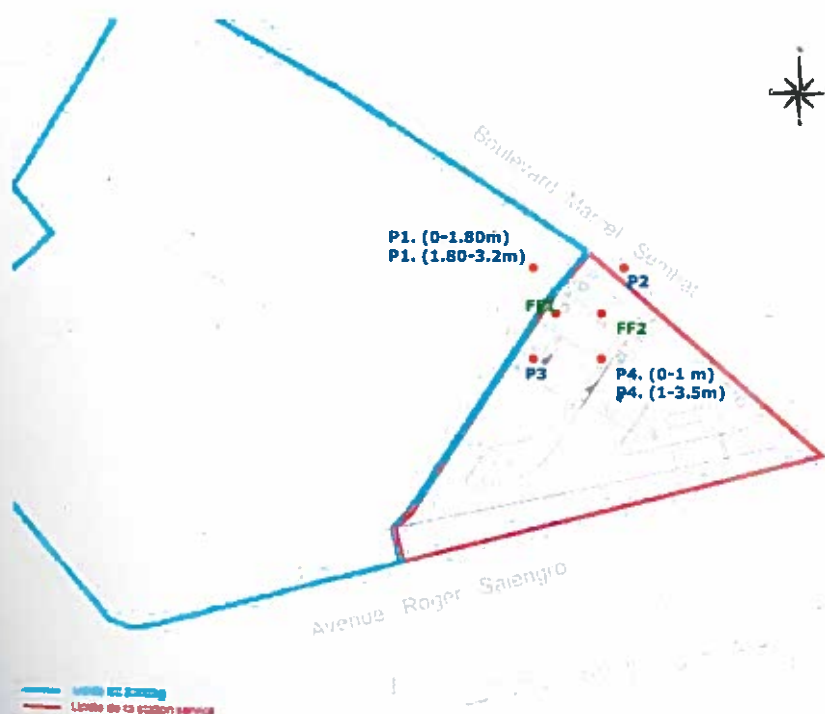


Figure 3 : Localisation des prélèvements de Paroi (P) et Fond Fouille (FF)
