


---

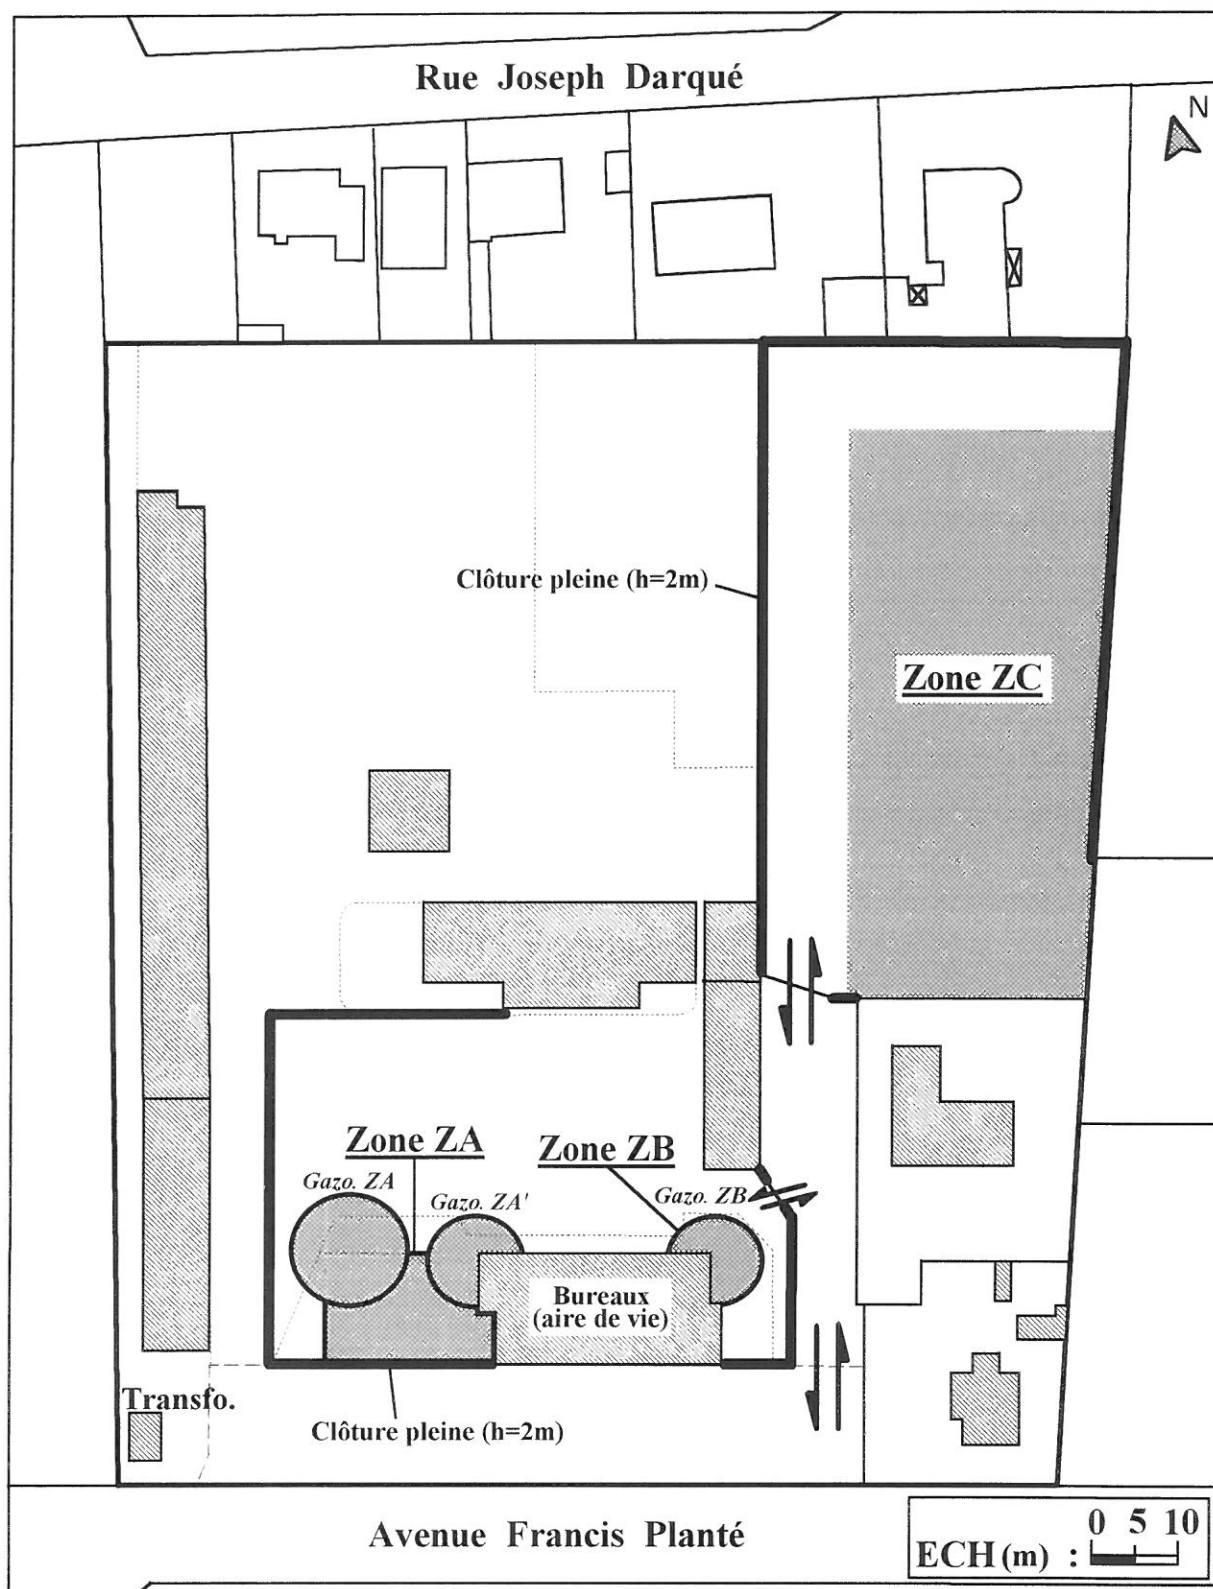
## **Annexe I**

### **Localisation du site et des zones de réhabilitation**

---





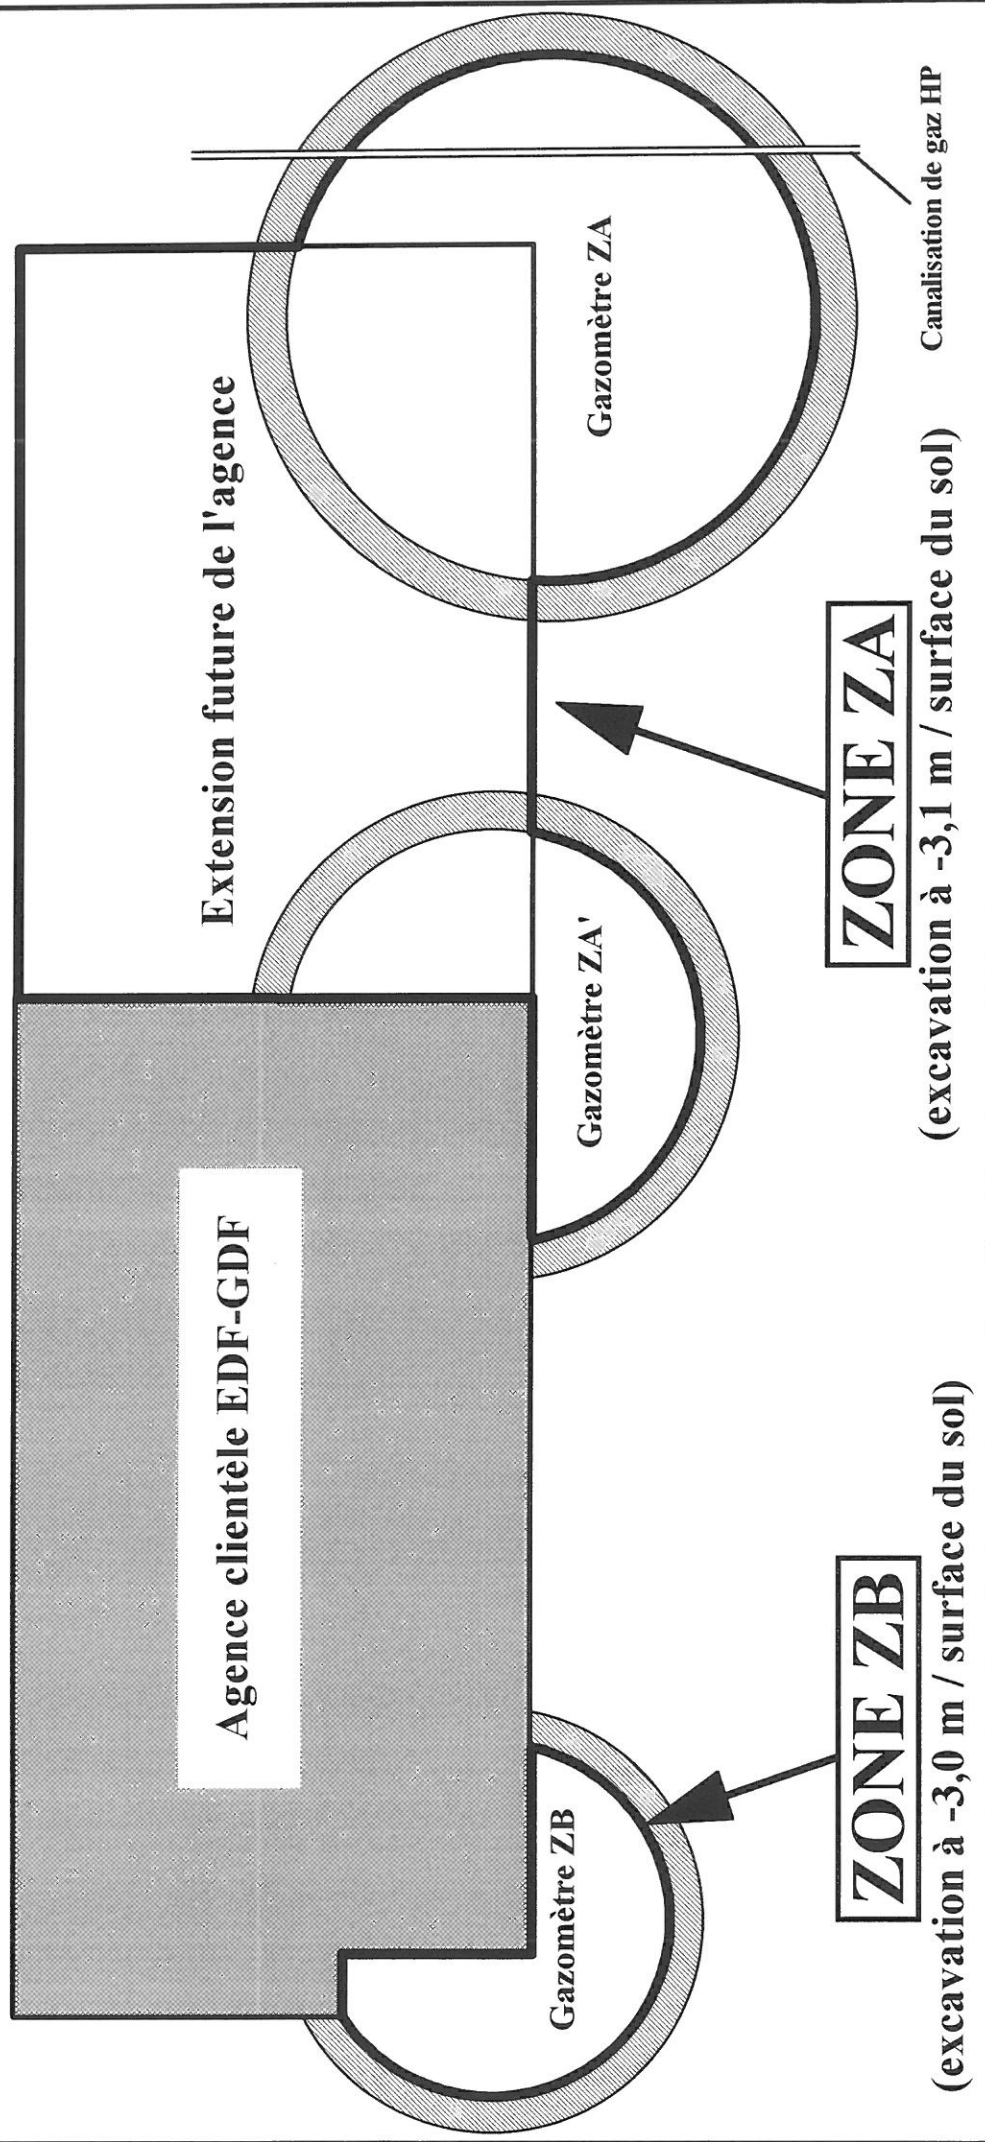






Site de l'ancienne usine à  
gaz de DAX  
(Avenue Francis Planté)



Localisation des zones de réhabilitation  
(zones d'excavation ZA et ZB et zone de confinement ZC)

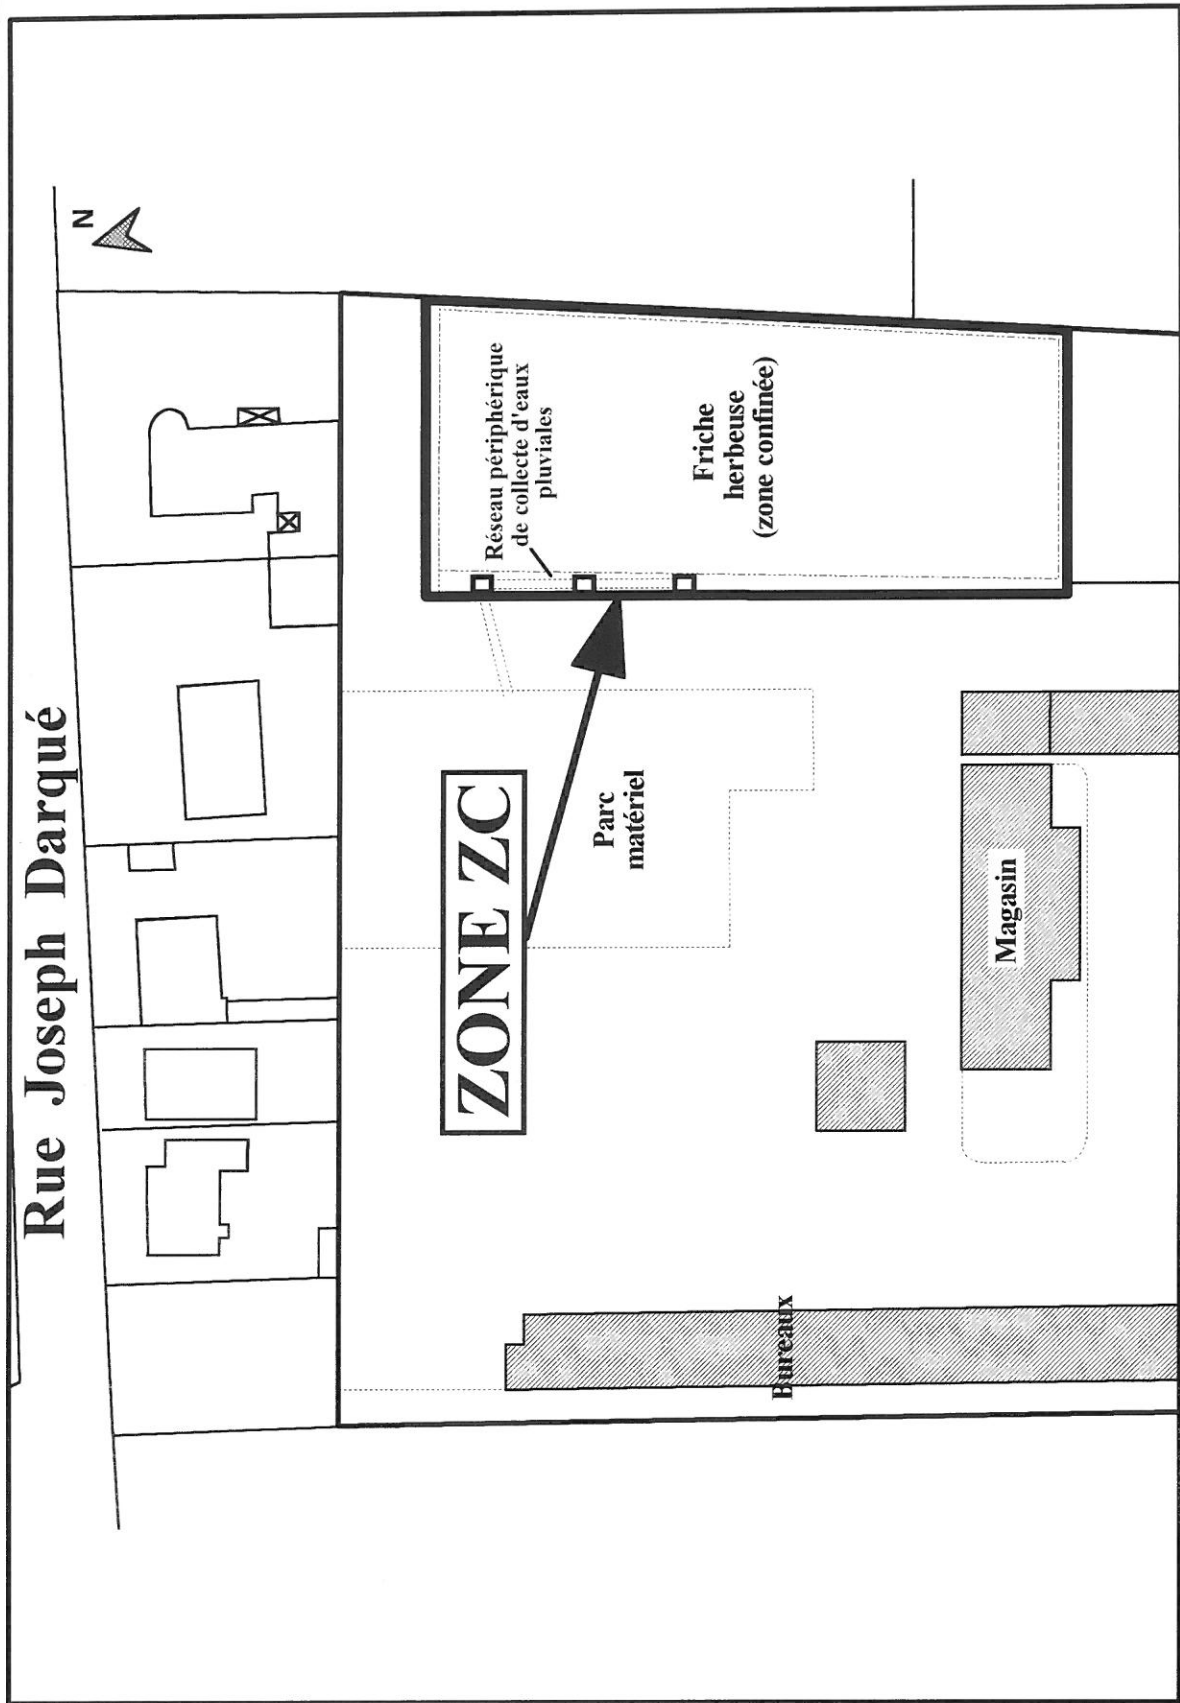
# Avenue Francis Planté






 HPC ENVIR ROTEC	Site de l'ancienne usine à gaz de DAX (13, avenue Francis Planté)	 
Localisation spatiale des 2 zones de réhabilitation dans la partie Sud du site (zones d'excavation ZA et ZB)		



# Rue Joseph Darqué



	Site de l'ancienne usine à gaz de DAX (13, avenue Francis Planté)	
Localisation spatiale de la zone de réhabilitation dans la partie Nord du site (zone de confinement ZC)	ECH :  (m)	



---

**Annexe II**

**Arrêté Préfectoral du 19/02/1998**

---



PREFECTURE DES LANDES

DIRECTION  
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Mont-de-Marsan, le 19 FEV. 1998

2ème BUREAU

☎ : 05.58.06.59.15

Poste tél. n°

Dossier suivi par  
Mme DUPRAT

ED/LN -ART14.00C

Monsieur le Directeur,

Par lettre en date du 4 février 1998, je vous ai transmis le projet d'arrêté préfectoral concernant la réhabilitation du site de l'ancienne usine à gaz de DAX.

Aucune observation par écrit directement ou par mandataire n'étant parvenue à mes services dans le délai de quinze jours, j'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté préfectoral définitif en date de ce jour accompagné de ses annexes.

Conformément à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

LE PREFET,

Pour la Prétet :  
Le Secrétaire Général,



Jacques MICHELOT

Monsieur le Directeur  
de EDF - GDF  
Services Sud-Aquitaine  
13, avenue Francis-Planté

40100 DAX

# PROJET D'ARRETE

VU la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,

VU la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 6,

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi susvisée et notamment son article 18,

VU l'audit environnement du site de l'ancienne usine à gaz de Dax en date du 11 février 1997 réalisé par le bureau d'études HPC Envirotec,

VU le rapport de l'Inspecteur des Installations Classées en date du 23 décembre 1997,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre en place un dispositif de surveillance des eaux souterraines,

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,

## ARRETE

### ARTICLE 1er

EDF-GDF Services Sud-Aquitaine est tenue de réaliser les travaux et de surveiller la nappe superficielle sur le site de l'ancienne usine à gaz sise 13, avenue Francis Planté 40100 DAX dans les conditions du présent arrêté.

### ARTICLE 2 : Travaux

Les travaux définis à l'article 1 consistent en :

2.1. - vidange et traitement du goudron et des remblais imprégnés de goudron contenu dans les anciens gazomètres localisés dans les zones n°7 et 8 du plan annexé au présent arrêté.

2.2. - étanchéification de la totalité de la friche herbeuse dans laquelle sont localisées les zones n°1 et 2 du plan annexé au présent arrêté. Cette surface sera aménagée en espace vert ou en aire de stationnement.

2.3. - un cahier des charges sera remis à l'inspecteur des Installations Classées préalablement à tout engagement de travaux. Il comportera notamment un descriptif des chantiers (choix des techniques, les conditions de mise en oeuvre, les moyens de contrôle, ...) ainsi que des mesures d'hygiène et sécurité.

2.4. - les déchets seront éliminés dans des installations prévues et autorisées à cet effet. Les stockages temporaires seront limités et mis en état de sécurité permanent. Les justificatifs d'enlèvement et de destruction des déchets seront adressés à l'inspecteur des Installations Classées.

### ARTICLE 3 : Surveillance

3.1. - la surveillance de la nappe superficielle sera assurée à l'aide de 4 piézomètres dont 3 nommés PZ1, PZ2 et PZ3 placés à l'intérieur du site et localisés sur le plan annexé au présent arrêté. Le 4ème piézomètre PZ4 sera installé à l'extérieur du site dont l'emplacement sera soumis à l'accord préalable de l'Inspecteur des Installations Classées.



3.2. - le profil piézométrique sera réalisé à l'aide de ces 4 points et au besoin, par des points existants ou à créer, en périodes de basses et hautes eaux.

Le niveau piézométrique de la nappe sera relevé à chaque contrôle ou prélèvement sur chacun des piézomètres.

3.3. - la qualité de l'eau de la nappe sera réalisée par des prélèvements et des analyses dans les 4 piézomètres ci-dessus aux périodes de basses et hautes eaux. Le protocole de prélèvement, de constitution, de conservation de l'échantillon et d'analyses sera adressé à l'Inspecteur des Installations Classées.

3.4. - les analyses seront effectuées sous la responsabilité de EDF-GDF Services Sud-Aquitaine, selon les normes AFNOR et porteront sur les paramètres suivants :

pH  
H.A.P.  
Cyanures totaux  
Cyanures libres  
Phénols

#### **ARTICLE 4 : Mesures conservatoires et servitudes**

4.1. - EDF-GDF Services Sud-Aquitaine s'assurera du maintien de l'étanchéité des surfaces localisées dans les zones 3, 4, 5 et 6 du plan annexé au présent arrêté.

4.2. - des mesures écrites de prévention comportant notamment le recensement et l'évaluation des sources de dangers ainsi que les moyens d'identification, de manipulation, de manutention de reconditionnement et de transport seront mis en place avant l'engagement de tous travaux sur le site.

4.3. - toute construction ou nouvelle construction est interdite dans les zones 1 à 6 du plan annexé au présent arrêté.

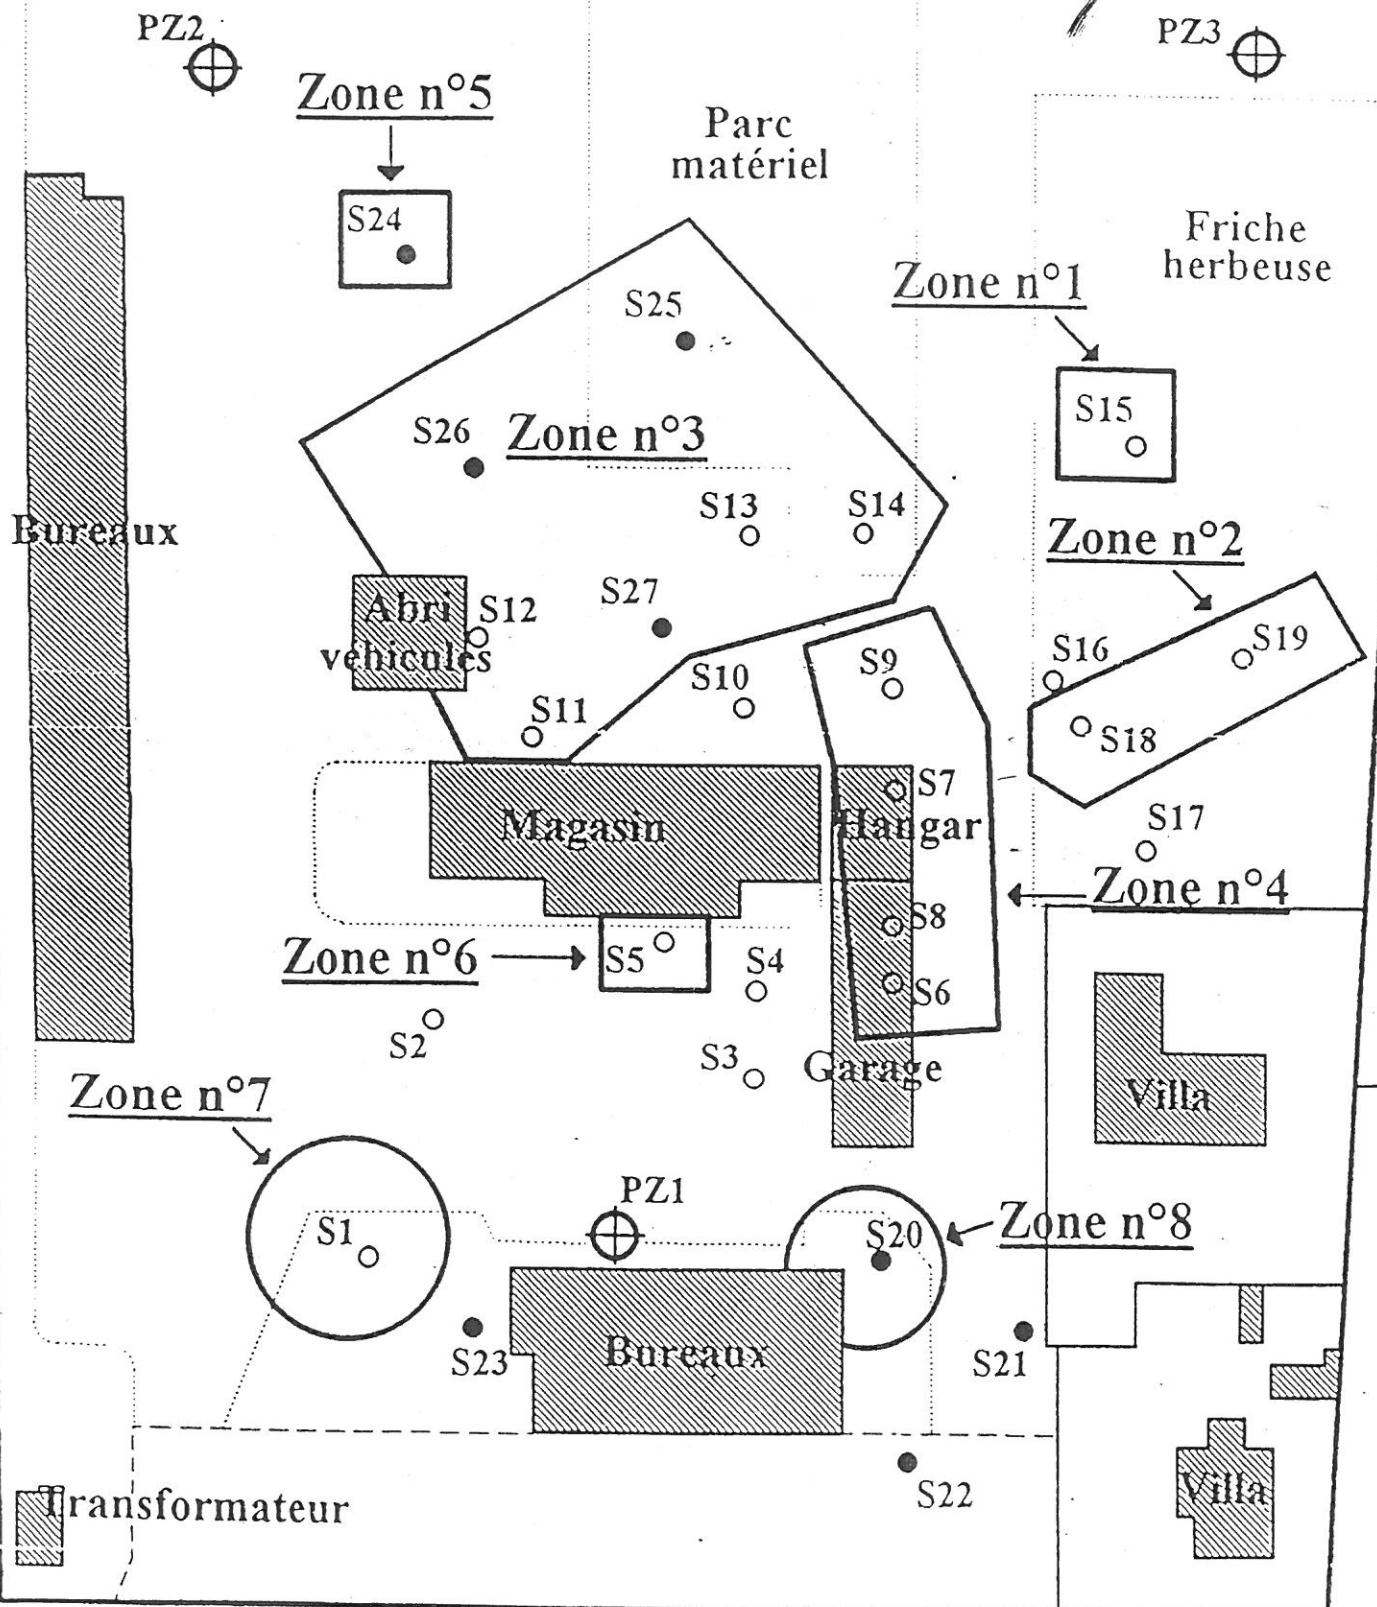
#### **ARTICLE 5**

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,
- M. l'Inspecteur des Installations Classées,
- M. le Directeur de EDF-GDF Services Sud-Aquitaine,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera déposée en Mairie de Dax.

Le Préfet,

Rue Joseph Darque



Si ○ Sondages initiaux (04 et 05/10/96)  
 Si ● Sondages complémentaires (13/01/97)  
 PZi ⊕ Piézomètre

Avenue Francis Planté



---

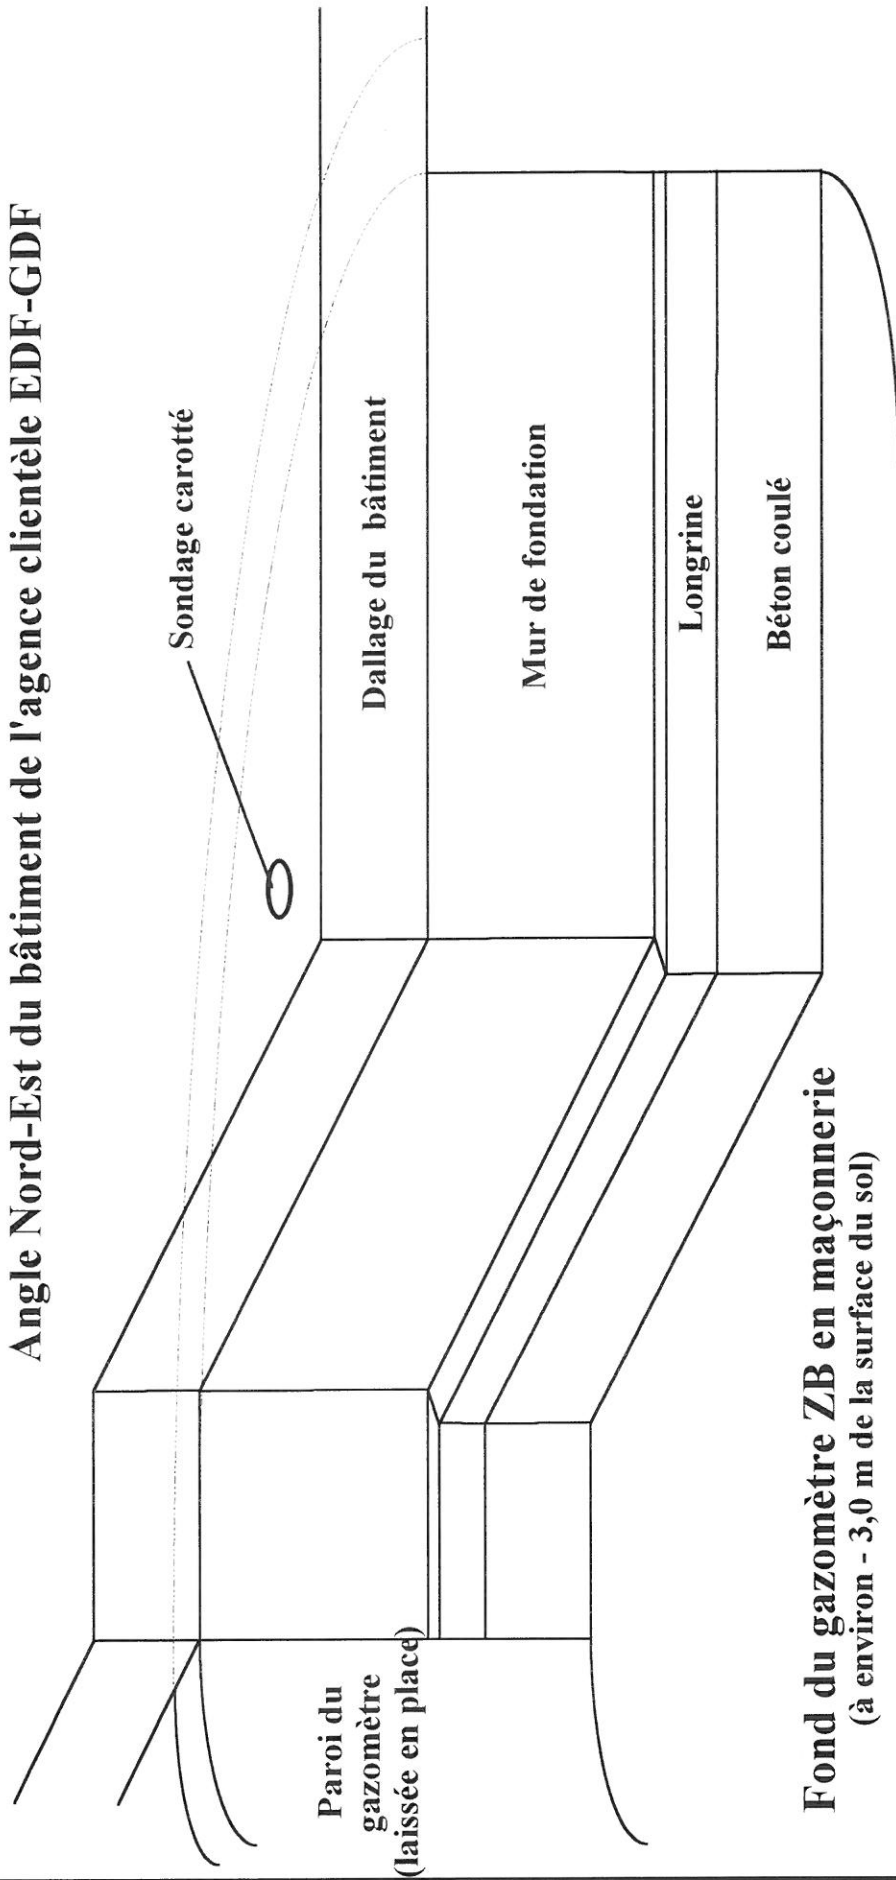
## **Annexe III**




### **Particularités des zones d'excavation**

---



# Angle Nord-Est du bâtiment de l'agence clientèle EDF-GDF



	Site de l'ancienne usine à gaz de DAX (13, avenue Francis Planté)	
Détail de l'implantation des fondations du bâtiment de l'agence clientèle EDF-GDF dans le gazomètre ZB		Ech(m) : 



# Angle Nord-Ouest du bâtiment de l'agence clientèle EDF-GDF (existence d'un sous-sol)

Dallage du bâtiment

Mur de fondation  
(mur du sous-sol du bâtiment)

Longrine

Béton coulé

Paroi du  
gazomètre  
(démolie au cours des travaux)

Fond du gazomètre ZA' en maçonnerie  
(à environ - 3,1 m de la surface du sol)



Site de l'ancienne usine à gaz  
de DAX  
(13, avenue Francis Planté)



Détail de l'implantation des fondations du bâtiment  
de l'agence clientèle EDF-GDF dans le gazomètre ZA'

Ech(m) : 0 1



---

## **Annexe IV**

### **Schéma de principe du confinement**

---



Réseau périphérique de collecte  
des eaux pluviales

Surface de  
la voie de  
circulation  
interne actuelle

Enrobé (parking)

Graves (0-30)  
et sables

**Sol originel (avant travaux)**

Bidim

Géomembrane

Bidim

Matériaux propres gravelo-terreux  
issus de la zone d'excavation ZA  
(nivelés puis compactés)

Tranchée d'ancrage (-1,5 m)  
remblayée de sables



Site de l'ancienne usine à gaz  
de DAX  
(13, Av. Francis Planté)

EDF  
GDF

**Schéma de principe du confinement de la zone ZC**



---

**Annexe V**  
**Photographies des travaux**

---





- **Zone d'excavation ZA** : vue latérale de la partie souterraine du gazomètre ZA (les matériaux hors emprise de la canalisation GSO ont été en partie extraits).



- **Zone d'excavation ZA** : raclage à la mini-pelle des matériaux souillés du fond de la partie souterraine du gazomètre ZA (hors emprise de la canalisation GSO).





- **Zone d'excavation ZA** : finition du nettoyage du fond de la partie souterraine du gazomètre ZA (hors emprise de la canalisation GSO).



- **Zone d'excavation ZA** : mise à jour manuelle de la canalisation GSO empiétant sur la partie souterraine du gazomètre ZA.





- **Zone d'excavation ZA** : Dégagement de la canalisation GSO et mise en place du dispositif d'étaie sous le contrôle d'un agent du GSO.



- **Zone d'excavation ZA** : vue générale de la partie souterraine du gazomètre ZA après nettoyage et étaie de la canalisation GSO.





- **Zone d'excavation ZA** : remblaiement de la partie souterraine du gazomètre ZA dans l'emprise de la canalisation GSO.



- **Zone d'excavation ZA** : compactage au rouleau compresseur du sable de dunes apporté dans la partie souterraine du gazomètre ZA.





- **Zone d'excavation ZA** : vue latérale de la partie souterraine du gazomètre ZA' (à droite : bâtiment de l'agence ; à gauche : paroi du gazomètre ZA).



- **Zone d'excavation ZA** : vue générale des matériaux présents dans la zone ZA entre les parties souterraines des 2 anciens gazomètres (ZA' : sur la gauche).





- **Zone d'excavation ZA** : mise à jour des matériaux souillés présents dans la partie souterraine du gazomètre ZA' (en arrière-plan : gazomètre ZA).

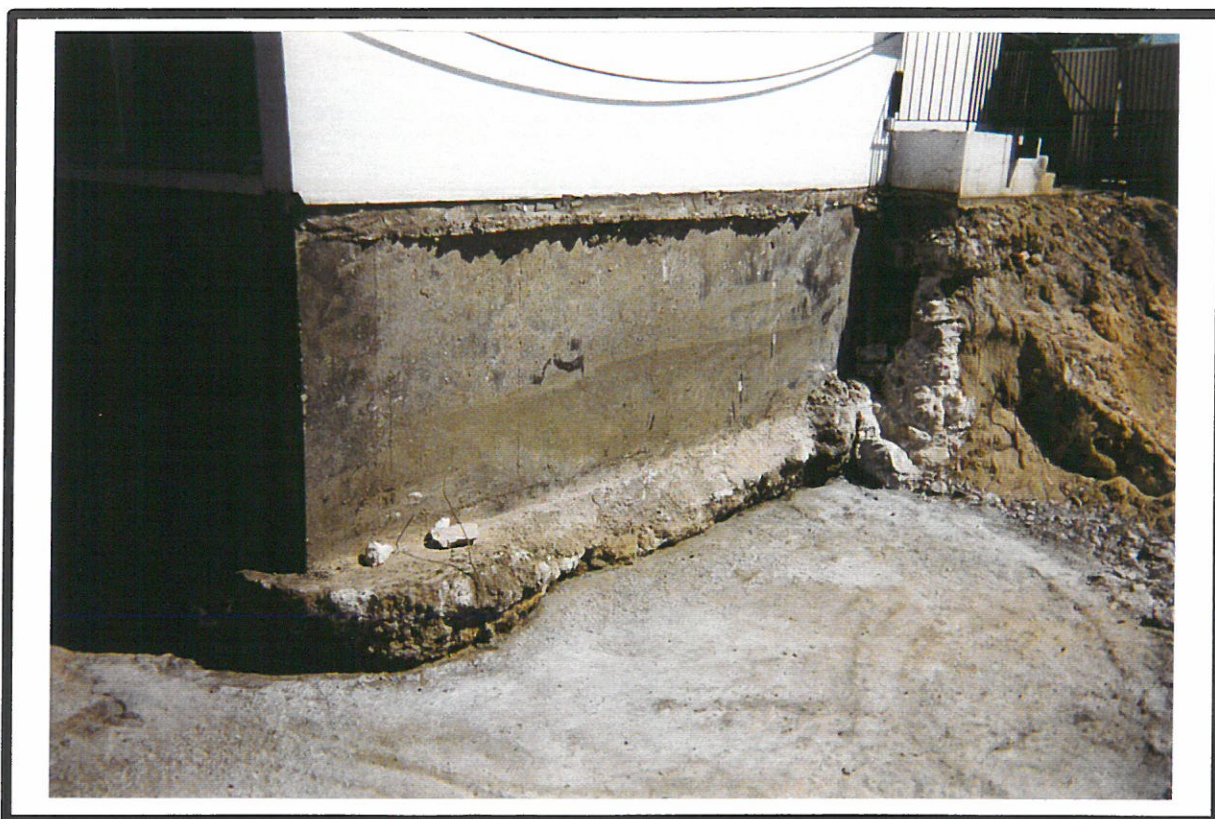


- **Zone d'excavation ZA** : bâchage en fin de journée par un film en polyane des matériaux mis à jour dans la partie souterraine du gazomètre ZA'.





- **Zone d'excavation ZA** : vue générale de la partie souterraine du gazomètre ZA' après nettoyage et démolition d'une partie de ses parois.



- **Zone d'excavation ZA** : vue de détail montrant l'ancrage des fondations du bâtiment de l'agence dans le fond de la partie souterraine du gazomètre ZA'.





- **Zone d'excavation ZB** : vue de 3/4 de la partie souterraine du gazomètre ZB (mise à jour des matériaux souillés : goudrons et remblais souillés de goudrons).



- **Zone d'excavation ZB** : pompage du goudron liquide présent dans la partie souterraine du gazomètre ZB (transport en citerne RTMDR).





- **Zone d'excavation ZB** : raclage à la mini-pelle des matériaux souillés présents dans le fond de la partie souterraine du gazomètre ZB.



- **Zone d'excavation ZB** : vue générale de la partie souterraine du gazomètre ZB raclée et nettoyée (les fondations du bâtiment sont ancrées sur son fond).





- **Zone d'excavation ZB** : mise en place d'un film polyane sur le fond de la partie souterraine du gazomètre ZB pendant la période de nettoyage.



- **Zone d'excavation ZB** : vue générale de la partie souterraine du gazomètre ZA après remblaiement (terre végétale en surface).





- **Zone de confinement ZC** : vue générale de la zone à confiner (début du dépôt de matériaux propres issus de la zone d'excavation ZA).



- **Zone de confinement ZC** : étalement de matériaux propres issus de la zone ZA sur la zone de confinement.





- **Zone de confinement ZC** : compactage au rouleau compresseur des matériaux propres issus de la zone ZA sur la zone de confinement.

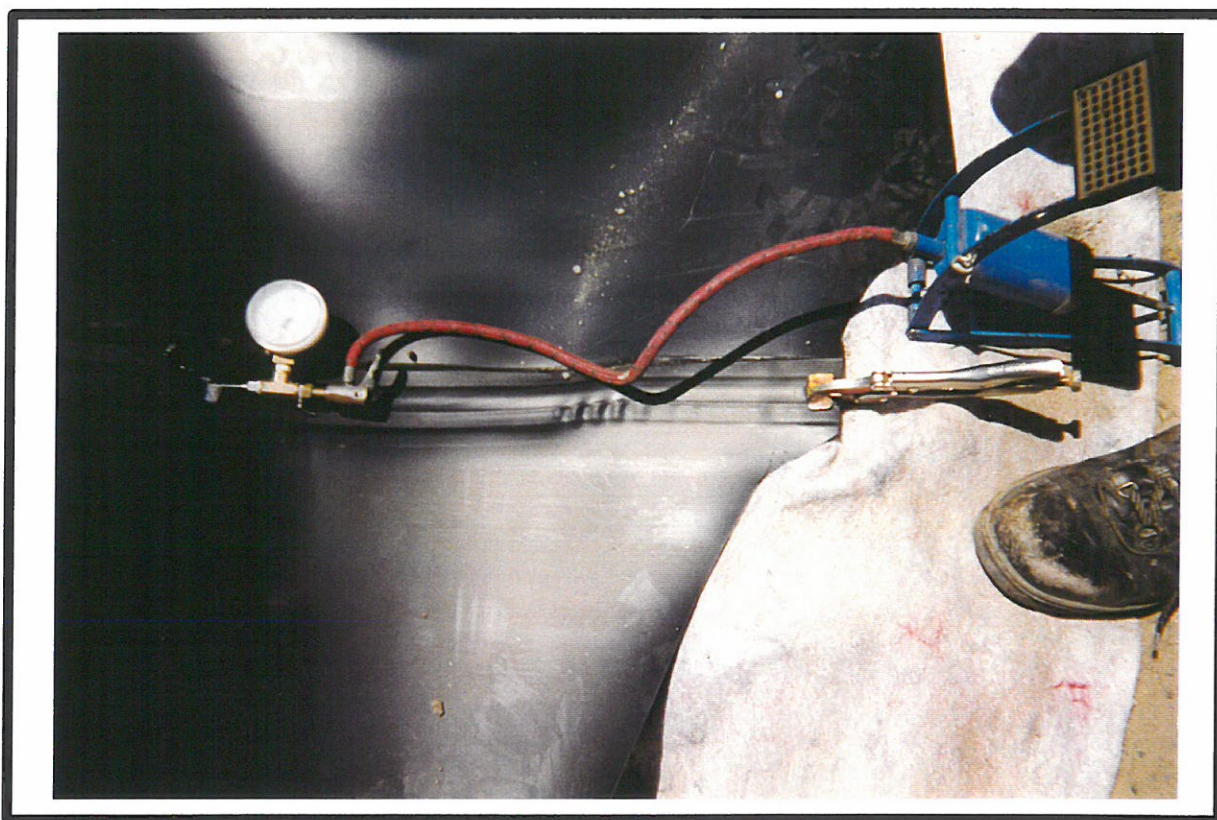


- **Zone de confinement ZC** : mise en place et ancrage des pans de géomembrane sur la zone de confinement (bidim blanc et géomembrane noire).





- **Zone de confinement ZC** : soudure des pans de géomembrane (double soudures réalisées à 120 °C à raison de 2 mètres/min).



- **Zone de confinement ZC** : contrôle de la bonne réalisation des soudures par insufflation d'air à une pression de 3 kg.





- **Zone de confinement ZC** : vue générale de la zone de confinement (bidim supérieur retenu par des sacs de sables pour éviter son envol par le vent).



- **Zone de confinement ZC** : mise en œuvre d'une couche de sable puis de graves sur le complexe de confinement avant réalisation de l'enrobé.



---

**Annexe VI**  
**Journal de suivi de chantier**

---



## JOURNAL DE CHANTIER

Les travaux de réhabilitation du site de l'ancienne usine à gaz de Dax ont débuté le 04 mai 1998 et se sont terminés le 08 juillet 1998. Ils se sont déroulés comme suit :

### ● Lundi 4 mai au jeudi 7 mai 1998 :

- ⇒ Réunion préalable au démarrage des travaux : Mr. Le Saux (EDF-GDF Sud Aquitaine - Maîtrise d'ouvrage), Mlle Laramendy (bureau de contrôle AFITEST), Mr. Vergnol (société DUBOS T.P. - Lot n°1), Mr. Rastelli (société COLIDEC - Lot n°2), Mr. Alliez (société géotechnique INGESOL).
- ⇒ Préparation de chantier (société DUBOS T.P.),
- ⇒ Mise en place de la clôture sur toute la périphérie du chantier,
- ⇒ Reconnaissance au tracto-pelle et début de déviation des réseaux souterrains existants.

### ● Lundi 11 mai 1998 (14h00 - 17h30) :

- ⇒ Réunion de chantier : Mr. Le Saux (EDF-GDF Sud Aquitaine - Maîtrise d'ouvrage), Mr. Langlois (société HPC Envirotec - Maîtrise d'œuvre), Mr. Vergnol (société DUBOS T.P. - Lot n°1), Mr. Alliez (société géotechnique INGESOL).
- ⇒ Travaux de reconnaissance de la zone ZB :
  - Reconnaissance au tracto-pelle du contenu du gazomètre ZB et prise d'échantillons de matériaux souillés pour transmission au centre d'incinération (SEDIBEX : lot n°3),
  - Reconnaissance au tracto-pelle des canalisations souterraines dans l'emprise et à proximité du gazomètre ZB (déviation d'un réseau de fibres optiques)
  - Réalisation par la société INGESOL d'un sondage carotté au droit du gazomètre ZB dans l'emprise du bâtiment de l'agence (à l'intérieur des locaux).
- ⇒ Travaux de reconnaissance de la zone ZA :
  - Reconnaissance au tracto-pelle du contenu du gazomètre ZA mettant en évidence la présence d'eaux d'accumulations de pluies,
  - Mise également en évidence de l'insertion du gazomètre ZA sous la canalisation gaz haute pression appartenant à GSO,
  - Début du décapage de l'ensemble de la zone ZA (terre végétale,...).



● **Mardi 12 mai au mardi 19 mai 1998 :**

⇒ Travaux dans la zone ZA

- Déviation des réseaux existants (eau et électricité),
- Fin du décapage de la surface de la zone et mise en dépôt sous polyane sur la zone ZC de la terre végétale extraite,
- Découverte et reconnaissance du gazomètre ZA' (jeudi et vendredi 15 mai 1998).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Décapage de la terre végétale présente au droit du gazomètre ZB et mise en dépôt sous polyane sur la zone ZC,
- Mise à jour des réseaux existants à proximité du gazomètre et reconnaissance de leur nature à l'aide de plans (intervention du personnel de GSO et de EDF-GDF),

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Début de la mise en place du réseau de collecte des eaux pluviales en périphérie de la future zone de confinement et connexion à l'existant,
- Dépôt sous polyanes de la terre végétale décapée dans les zones ZA et ZB.

● **Mardi 15 mai 1998 :**

⇒ Réunion de chantier : Mr. Le Saux (EDF-GDF Sud Aquitaine - Maîtrise d'ouvrage), Mr. Crantz (Architecte), Mr. Vergnol (société DUBOS T.P. - Lot n°1), Mr. Alliez (société géotechnique INGESOL), Mr. Rastelli (société COLIDEC - Lot n°2), Melle Laramendy (AFITEST).

● **Mercredi 20 mai 1998 :**

⇒ Réunion de chantier : Mr. Le Saux (EDF-GDF Sud Aquitaine - Maîtrise d'ouvrage), Mr. Langlois (société HPC Envirotec - Maîtrise d'œuvre), Mr. Vergnol (société DUBOS T.P. - Lot n°1), Mr. Alliez (société géotechnique INGESOL).

● **Lundi 25 mai 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Début de l'excavation des matériaux propres présents dans le gazomètre ZA à l'exception de ceux présents dans la zone de passage de la canalisation de gaz haute pression,
- Début de l'excavation des matériaux propres présents à l'intérieur du gazomètre ZA',



⇒ Travaux dans la zone ZA (suite 25 mai 1998) :

- Début de l'excavation des matériaux sur le reste de l'emprise du futur bâtiment (l'ensemble de ces matériaux est apparu exempt de souillures). Le terrassement est réalisé en créant un talus périphérique afin d'éviter d'éventuels éboulements de matériaux,
- Début du pompage des eaux d'accumulations de pluie présentes dans le gazomètre ZA et rejet aux égouts. Visite de Mr. Bachele de la Régie des Eaux de Dax constatant les bonnes qualités organoleptiques des eaux rejetées,
- Mise à jour d'une partie des matériaux souillés présents dans le fond du gazomètre ZA,
- Transport d'une partie des matériaux propres excavés vers un CET de classe 3,
- Couverture des matériaux souillés mis à jour par du polyane et balisage de la zone excavée par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Extraction des matériaux propres contenus dans le gazomètre ZB et transport vers le CET 3,
- Mise à jour des matériaux souillés présents à l'intérieur du gazomètre,
- Pompage des eaux fortement souillées et du goudron liquide présents dans le fond du gazomètre à l'aide d'une citerne RTMDR,
- Couverture des matériaux souillés mis à jour par du polyane et balisage de la zone d'excavation par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Fin de la mise en place du réseau de collecte des eaux pluviales en périphérie de la future zone de confinement (connecté à l'existant).

● **Mardi 26 mai 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Poursuite de l'excavation des matériaux propres à l'exception de ceux présents dans le gazomètre ZA au droit du passage de la canalisation de gaz haute pression,
- Une partie des matériaux propres excavés (sables) est acheminée vers la zone ZC, le reste étant envoyée vers le CET de classe 3 (gravats, blocs),
- Poursuite du rejet aux égouts des eaux d'accumulations de pluie présentes dans le gazomètre ZA,
- Fin de l'extraction des matériaux propres présents dans le gazomètre ZA',
- Couverture des matériaux souillés par du polyane (gazomètres ZA et ZA') et balisage de la zone excavée par une rubalise (fin de journée).



⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Début de l'excavation des matériaux souillés présents à l'intérieur du gazomètre ZB et transport vers le centre d'incinération (1 camion),
- Poursuite et fin du pompage des liquides souillés et transport vers le centre d'incinération,
- Couverture de la zone excavée par du polyane et balisage par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Arasage de l'ensemble de la zone à confiner au tracto-pelle,
- Mise en dépôt à proximité de la zone à confiner d'une partie des matériaux propres (sables) excavés dans la zone ZA.

● **Mercredi 27 mai 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Fin du rejet aux égouts des eaux d'accumulations de pluie présentes dans le gazomètre ZA,
- Poursuite de l'excavation des matériaux propres présents entre les gazomètres ZA et ZA' et mise en dépôt sur la zone ZC (sables),
- Transfert vers le gazomètre ZA' des matériaux souillés présents dans la partie mise à jour du gazomètre ZA afin de permettre l'extraction ultérieure des matériaux présents sous la canalisation de gaz haute pression,
- Couverture des matériaux souillés par du polyane (gazomètre ZA' et talus créé dans le gazomètre ZA) et balisage de la zone excavée par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Poursuite de l'excavation des matériaux souillés présents à l'intérieur du gazomètre ZB et transport vers le centre d'incinération (1 camion),
- Début du raclage à la mini-pelle des goudrons présents dans le fond et sur les parois du gazomètre ZB (pour cette opération, le port du masque respiratoire a été jugé nécessaire),
- Couverture de la zone excavée par du polyane et balisage par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'arasage de l'ensemble de la zone à confiner au tracto-pelle,
- Poursuite de la mise en dépôt à proximité de la zone à confiner d'une partie des matériaux propres (sables) excavés dans la zone ZA.



● **Jeudi 28 mai 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Arrêt des excavations des matériaux présents entre les gazomètres ZA et ZA' dans l'attente de l'intervention des services de GSO (excavation au droit de la canalisation gaz HP),
- Début du démantèlement d'une partie de la paroi du gazomètre ZA à l'aide de la pelle mécanique (dans l'emprise du futur bâtiment).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Poursuite du raclage du fond et des parois du gazomètre ZB (tracto-pelle et mini-pelle)
- Finition manuelle du raclage des souillures résiduelles présentes dans le gazomètre. Les matériaux souillés sont extraits simultanément, chargés puis transportés vers le centre d'incinération (1 camion),
- Couverture par du polyane du fond du gazomètre nettoyé et balisage par une rubalise (fin de journée) dans l'attente de l'accord de remblaiement.

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Aucuns travaux n'ont été réalisés dans cette zone.

● **Vendredi 29 mai 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Raclage à la mini-pelle et au tracto-pelle des matériaux souillés présents dans le fond de la partie excavée du gazomètre ZA et transfert de ceux-ci dans le gazomètre ZA',
- Poursuite du démantèlement de la paroi du gazomètre ZA à la pelle mécanique,
- Début de l'extraction des matériaux souillés présents à l'intérieur du gazomètre ZA' et transport vers le centre d'incinération (2 camions),
- Couverture par du polyane du gazomètre ZA' et balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Pas de travaux dans cette zone dans l'attente de l'accord de remblaiement.

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Aucuns travaux n'ont été réalisés dans cette zone.



● **Mardi 02 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Poursuite de l'extraction des matériaux souillés présents à l'intérieur du gazomètre ZA' et transport vers le centre d'incinération (2 camions),
- Visite de Mr. Quideau (GSO - District de Lussagnet) afin de définir les consignes à appliquer lors de la réalisation des travaux dans l'emprise de la canalisation gaz HP,
- Dégagement de la partie supérieure de la canalisation gaz HP au tracto-pelle (et manuellement) sur toute la longueur concernée par les travaux sous la surveillance d'un technicien de GSO,
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Pas de travaux dans cette zone dans l'attente de l'accord de remblaiement.

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Aucuns travaux n'ont été réalisés dans cette zone.

● **Mercredi 03 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Poursuite et fin de l'extraction des l'ensemble des matériaux présents dans le gazomètre ZA et mise en place du dispositif d'étalement de la canalisation gaz HP sous la surveillance du technicien de GSO gazomètre ZA',
- Transfert dans le gazomètre ZA' des matériaux souillés restant dans le gazomètre ZA,
- Transfert des matériaux propres excavés du gazomètre ZA vers la zone ZC,
- Réunion d'avancement de chantier (EDF-GDF Sud Aquitaine, AFICOOR, AFITEST, HPC Envirotec, DUBOS T.P. et INGESOL),
- Raclage à la mini-pelle et au tracto-pelle du fond et des parois de la totalité du gazomètre ZA et transfert des matériaux souillés extraits dans le gazomètre ZA',
- Démantèlement des parois du gazomètre ZA dans l'emprise du futur bâtiment,
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise et couverture du gazomètre ZA' par du polyane (fin de journée).



⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Pas de travaux dans cette zone dans l'attente de l'accord de remblaiement.

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Début de l'étalement sur la zone ZC des matériaux propres provenant des excavations de la zone ZA afin d'obtenir une pente convenable pour l'écoulement futur des eaux pluviales,

● **Jeudi 04 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Poursuite de l'extraction des matériaux souillés présents dans le gazomètre ZA' et transport vers le centre d'incinération (2 camions),
- Début du démantèlement à la pelle mécanique de la paroi du gazomètre ZA' se trouvant dans l'emprise du futur bâtiment,
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise et couverture du gazomètre ZA' par du polyane (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Remblaiement du gazomètre ZB avec des matériaux propres (sables principalement) issus postérieurement des excavations de la zone ZA,
- Compactage du sable à l'aide du godet de la pelle mécanique.

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'étalement des matériaux propres provenant des excavations de la zone ZA,
- Début du compactage des matériaux étalés au rouleau compresseur,
- Réalisation de la tranchée périphérique pour effectuer l'ancrage ultérieur du complexe de confinement (géomembrane),

● **Vendredi 05 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Poursuite et fin de l'extraction des matériaux souillés présents dans le gazomètre ZA' (raclage manuel et à la mini-pelle) et transport vers le centre d'incinération (1 camion),



⇒ Travaux dans la zone ZA (suite du 05 juin 1998) :

- Pompage des goudrons liquides et pâteux présents dans le fond du gazomètre ZA' simultanément à l'extraction des matériaux pelletables, et transport vers le centre d'incinération en citerne RTMDR,
- Début du remblaiement du gazomètre ZA (sable de dunes). Le remblaiement de la zone concernée par la canalisation gaz HP est réalisé sous la surveillance du technicien GSO,
- La partie remblayée est régulièrement compactée au rouleau compresseur afin d'assurer une portance suffisante des matériaux apportées pour le bâtiment futur,
- Fin des excavations des matériaux propres originels présents dans la zone Z3 (« rampe d'accès ») et transport de ceux-ci vers le CET de classe 3,
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise et couverture du gazomètre ZA' par du polyane (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Pas de travaux réalisés dans cette zone.

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'étalement et du compactage des matériaux propres provenant des excavations de la zone ZA.

● **Lundi 08 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Fin du démantèlement des parois du gazomètre ZA' dans l'emprise du futur bâtiment,
- Poursuite du remblaiement du gazomètre ZA (sable de dunes) et du compactage au rouleau compresseur,
- Pas de remblaiement du gazomètre ZA' dans l'attente de la visite de la DRIRE,
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Pas de travaux réalisés dans cette zone.



⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'étalement et du compactage des matériaux propres provenant des excavations de la zone ZA,
- Préparation des bordures de la zone de confinement (nivellement au tracto-pelle),
- Arrivée et stockage des rouleaux de géomembrane et de bidim.

● **Mardi 09 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Poursuite du compactage du sable apporté dans la zone ZA puis arrêt dans l'attente de la réalisation de sondages pénétrométriques (INGESOL) permettant d'assurer la bonne tenue du sol et ainsi de valider la poursuite du remblaiement,
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Finalisation du remblaiement du gazomètre ZB par de la terre végétale.

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Finalisation de l'étalement des matériaux propres sur la zone de confinement à l'aide d'une couche uniforme de sable puis reprise du compactage,
- Mise en œuvre du complexe de confinement (bidim - géomembrane - bidim) et ancrage dans la tranchée périphérique,
- Soudure des pans de géomembrane et contrôle de chaque soudure,
- Lestage du bidim supérieur à l'aide de sacs de sable afin d'éviter son envol,
- Apport et étalement de terre végétale sur les bordures de la zone de confinement.

● **Mercredi 10 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Réalisation de sondages pénétrométriques (INGESOL) au sein de la zone remblayée et compactée,
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZB :

- Travaux terminés dans cette zone.



⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Mise en œuvre de sable dans la tranchée d'ancrage du complexe de confinement,
- Début de l'apport et de l'étalement d'une couche uniforme de sable en surface du complexe de confinement,
- Apport et étalement de graves 0-30 à l'entrée et à la sortie du futur parking.

● **Jeudi 11 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Nettoyage des abords de la zone de travaux,
- Réunion d'avancement et visite de chantier (EDF-GDF Sud Aquitaine, GDF DSFJ, HPC Envirotec, DRIRE Mont-de-Marsan et DUBOS T.P.),
- Balisage de l'ensemble de la zone ZA par une rubalise (fin de journée).

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Fin de la mise en œuvre de sable dans la tranchée d'ancrage du complexe de confinement,
- Fin de l'apport et de l'étalement d'une couche uniforme de sable en surface du complexe de confinement et début de l'apport et étalement d'une couche uniforme de graves 0-30.

● **Vendredi 12 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Arrêt des travaux dans cette zone dans l'attente des résultats des sondages pénétrométriques réalisés par INGESOL,

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'apport et de l'étalement des graves 0-30 sur la zone confinée.

● **Lundi 15 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Attente des résultats des sondages pénétrométriques réalisés par INGESOL,



⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'apport et de l'étalement des graves 0-30 sur la zone confinée.

● **Mardi 16 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Reprise des travaux de remblaiement et de compactage sur toute la zone ZA après réception de résultats positifs des essais pénétrométriques d'INGESOL,

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'apport et de l'étalement des graves 0-30 sur la zone confinée.

● **Mardi 16 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Reprise des travaux de remblaiement et de compactage sur toute la zone ZA après réception de résultats positifs des essais pénétrométriques d'INGESOL,

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Poursuite de l'apport et de l'étalement des graves 0-30 sur la zone confinée.

● **Mardi 23 juin 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZA :

- Travaux terminés dans cette zone (remblaiement et compactage).

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Remblaiement et mise en forme (compactage et nivellement) terminés.

● **Mardi 07 juillet 1998 (08h00 - 17h00) :**

⇒ Travaux dans la zone ZC :

- Mise en œuvre de l'enrobé du futur parking et marquage au sol des places.



---

**Annexe VII**  
**Bordereaux de suivi de déchets**

---



## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

F. P. 7076MR33

<b>PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : GAZ DE FRANCE		RESPONSABLE : M. LE SAUX	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : BAYONNE (64)			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : eaux chargées en hydrocarbures		CODE NOMENCLATURE : 11.5.01.5.2	
		AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION :	
		N° DE GROUPE	
CONSISTANCE DU DÉCHET :		<input type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input checked="" type="checkbox"/> LIQUIDE	
TRANSPORT :		<input type="checkbox"/> BENNE <input checked="" type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> FÛTS NBRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :	
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : Centre SEDIBEX		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE :	
- INSTALLATION :			
- ADRESSE - TÉLÉPHONE : Le Havre			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies,		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : 25/05/98	
Signature : F. LANGLOIS		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : 16 TONNES	

## 2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR

DÉNOMINATION : SOLIDEC SA		N° SIRET : 377 541 917 000 29	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99		RESPONSABLE : M. Jacques DUMAS	
STOCKAGE		DATE DE REMISE À L'ÉLIMINATEUR : 25/5/98	
<input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : 16 TONNES	
<input checked="" type="checkbox"/> NON			
Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature : [Signature]			

## 3 DESTINATAIRE

DÉNOMINATION : SEDIBEX Centre SEDIBEX		N° SIRET : 30368786700026	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Route Industrielle Portuaire du HAVRE 76430 SANDOUVILLE Tel: 02.32.79.54.10		RESPONSABLE : M. JC FAUQUANT M. TENARD	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET :		CODE FILIÈRE A.F.B. :	
<input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ			
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT :			
- DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT : - DESTINATION FINALE DU DÉCHET			
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :		DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : 28/05/1998	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : 8 820 TONNES	


Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24 - 3° de la Loi N° 75-633 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur





## BORDEBEAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

7856. andré

<b>PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : GAZ DE FRANCE		RESPONSABLE : M. LE SAUX	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : BAYONNE (64)			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : Souchons et semblables saucettes par des gouchons	CODE NOMENCLATURE : 13.02.11.5.2	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION :	N° DE GROUPE
CONSISTANCE DU DÉCHET :		<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE	
TRANSPORT : <input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITERNE		<input type="checkbox"/> FÛTS NBRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :	
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : Centre SEDIBEX - INSTALLATION : - ADRESSE - TÉLÉPHONE : Le Havre (76)		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : 1657 98 05	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies, Signature : FLANGELOIS 		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : 26/05/98 QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : 20 TONNES	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : 377 541 917 000 29	
DÉNOMINATION : COLIDEC SA		RESPONSABLE : M. Jacques DUMAS	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Pue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99			
STOCKAGE	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature : 		DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : 26/5/98
<input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage <input checked="" type="checkbox"/> NON			QUANTITÉ TRANSPORTÉE : 20 TONNE =

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : 30368786700026	
DÉNOMINATION : SEDIBEX Centre SEDIBEX		RESPONSABLE : M. JC FAUQUANT	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Nouveau Industrielle Portuaire du HAVRE 76430 SANDOUVILLE (76) Tel: 02.32.79.54.10		CODE FILIÈRE A.F.B. : 	
OPERATION SUR LE DÉCHET : <input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE			
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT :		-- DESTINATION FINALE DU DÉCHET	
- DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT :			
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature : 	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : 27/05/1998	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : 23 TONNE 840	



## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

4052. prié.

2

<b>PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
NOMINATION : GAZ DE FRANCE		RESPONSABLE : M. LE SAUX	
RESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : BAYONNE (64)			
SIGNATURE DU DÉCHET : gouchons et remblais utilisés par des gouchons		CODE NOMENCLATURE : 3 0 2 1 5 2	
		AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION :	
		N° DE GROUPE :	
SISTANCE DU DÉCHET :		<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE	
TRANSPORT :		<input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> FÛTS NBRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :	
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : Centre SEDIBEX		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : 16579805	
- INSTALLATION :			
- ADRESSE - TÉLÉPHONE : Le Havre (76)			
Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies, Signature : F. LANGLOIS		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : 27/05/98	
		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : 1.20 TONNES	

<b>COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : 377 541 917 000 29	
NOMINATION : IDEC SA		RESPONSABLE : M. Jacques DUMAS	
RESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99			
STOCKAGE		DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : 28-5-98	
OUI Lieu de stockage		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : 70 TONNE	
NON			
Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature : 			

<b>DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : 30368780700020	
NOMINATION : SEDIBEX Centre SEDIBEX		RESPONSABLE : M. JC FAUQUANT M. TENARD	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Route Industrielle Portuaire du HAVRE 76430 SANDOUVILLE (76) Tél : 02 32 129 54 10 SANDOUVILLE		CODE FILIÈRE A.F.B. : 	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET :		<input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ	
<input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE			
CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
CAS DE PRÉTRAITEMENT :			
DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT :		-- DESTINATION FINALE DU DÉCHET : 28/05/1998	
DÉBUTS DE PRISE EN CHARGE LE :		Signature : 	
SOLICITÉS :		DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : 28/05/1998	
		QUANTITÉ REÇUE : 29 560 TONNES	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24 - 3° de la Loi N° 75-633 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur





## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

Lorient → Doni.

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : <b>GAZ DE FRANCE</b>		RESPONSABLE : <b>M. LE SAUX</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>BAYONNE (64)</b>			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : <b>gouchons et remblais souillés par des gouchons</b>	CODE NOMENCLATURE : <b>3,0,2,1,3,2</b>	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION :	N° DE GROUPE
CONSISTANCE DU DÉCHET :	<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE	<input type="checkbox"/> BOUES	<input type="checkbox"/> LIQUIDE
TRANSPORT :	<input checked="" type="checkbox"/> BENNE	<input type="checkbox"/> CITERNE	<input type="checkbox"/> FÛTS NBRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : <b>Centre SEDIBEX</b>		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : <b>1657 98 05</b>	
- INSTALLATION :			
- ADRESSE - TÉLÉPHONE : <b>Le Havre (76)</b>			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies,			
Signature : <b>F. LANGLOIS</b>		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : <b>28/05/98</b>	
		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : <b>≈ 20 TONNES</b>	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : <b>377 541 917 000 29</b>	
DÉNOMINATION : <b>COLIDEC SA</b>		RESPONSABLE : <b>M. Jacques DUMAS</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99</b>			
STOCKAGE	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature : 	DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR :	
<input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : <b>≈ 20 TONNES</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NON			


<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : <b>30368786700026</b>	
DÉNOMINATION : <b>SEDIBEX</b> <b>CENTRE SEDIBEX</b>		RESPONSABLE : <b>M. JC FAUQUANT</b> <b>M. TENARD</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Rue Industrielle Portuaire du HAVRE 76430 SANDOUVILLE Tél. 02.32.79.54.10 Sandooville</b>		CODE FILIÈRE A.F.B. : 	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET : <input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION		<input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ	
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT : - DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT : <b>DESTINATION FINALE DU DÉCHET</b>			
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature : 	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : <b>02/06/1998</b>	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : <b>19 TONNES 560</b>	

# BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

andré 7856.

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : <b>GAZ DE FRANCE</b>		RESPONSABLE : <b>M<sup>r</sup> LE SAUX</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>BAYONNE (64).</b>			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : <b>gachons et remblais saillies par des gachons</b>	CODE NOMENCLATURE <b>302152</b>	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION :	N° DE GROUPE
CONSISTANCE DU DÉCHET :		<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE	<input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE
TRANSPORT :		<input checked="" type="checkbox"/> BENNE	<input type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> FÛTS NBRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : <b>Centre SEDIBEX</b> - INSTALLATION : - ADRESSE - TÉLÉPHONE : <b>Le Havre (76)</b>		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : <b>16579805</b>	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies. Signature : <b>F. LANGLOIS</b>		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : <b>29/05/98</b> QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : <b>~ 20 TONNES</b>	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : <b>337 541 917 000 29</b>	
DÉNOMINATION : <b>COLIDEC SA</b>		RESPONSABLE : <b>M. Jacques DUMAS</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99</b>			
STOCKAGE	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature : 		DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : <b>2.06.98</b>
<input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage			QUANTITÉ TRANSPORTÉE : <b>20 ~ TONNE</b>
<input checked="" type="checkbox"/> NON X			

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : <b>30368786700026</b>	
DÉNOMINATION : <b>SEDIBEX</b>		RESPONSABLE : <b>M. C. FAUQUANT</b>	
ADRESSE : <b>Rue Industrielle Sandouville</b>		MODE FILIÈRE A.F.B. : <input type="checkbox"/>	
TÉLÉPHONE : <b>76430 SANDOUVILLE</b>			
TÉLEX : <b>Tel: 02.32.79.54.10</b>			
OPÉRATION SUR LE DÉCHET :		<input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ	
<input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE			
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT :			
- DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT :		- DESTINATION FINALE DU DÉCHET	
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature : 	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : <b>02/06/1998</b>	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : <b>24 TONNE 320</b>	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24 - 3° de la Loi N° 75-633 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur

Autocopiant Afnor VII 50 g à 60



## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

phil. 4052

5

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : GAR DE FRANCE		RESPONSABLE : M. LE SAUX	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : BAYONNE (64)			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : saucisses et saucissons emballés par des gâteaux	CODE NOMENCLATURE : 3.8.2.1.5.2	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION : 15.01.03.07.7	N° DE GROUPE 90.01.01.01
CONSISTANCE DU DÉCHET : <input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE			
TRANSPORT : <input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> FÛTS NBRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :			
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : CENTRE SEDIBEX		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE :	
- INSTALLATION :		16.57.98.05	
- ADRESSE - TÉLÉPHONE : Le Havre (76)			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies, Signature : F. LANGLOIS		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : 29/05/98	
		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : 320 TONNES	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : 377 541 977 000 29	
DÉNOMINATION : Colidac		RESPONSABLE : M. Jacques Durmas	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Rue Goya BP 37 33520 Barsans			
STOCKAGE <input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature :	DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : 2 - 6 - 98	
<input checked="" type="checkbox"/> NON		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : 20 TONNE	

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : 30368786700026	
DÉNOMINATION : SEDIBEX		RESPONSABLE : M. JC FAUQUANT	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Centre SEDIBEX Route Industrielle Portuaire du HAVRE 76430 SANDOUILLE Tel: 02.32.79.54 Sandoville		CODE FILIÈRE A.F.B. :	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET : <input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ <input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE			
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRETRAITEMENT : - DESCRIPTION DU PRETRAITEMENT : -- DESTINATION FINALE DU DÉCHET			
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature :	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : 02/06/1998	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : 26 TONNE 240	



N° 07 0320

## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

6

patech.

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : GAZ DE FRANCE		RESPONSABLE : M. LE SAUX	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : BAYONNE (64)			
DESIGNATION DU DÉCHET : gachon et similaires saillies par des gachons	CODE NOMENCLATURE : 13.02.11.5.2	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIERE D'ASSIMILATION : 3077	N° DE GROUPE 90
CONSISTANCE DU DÉCHET : <input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE			
TRANSPORT : <input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> Fûts Nbre : <input type="checkbox"/> AUTRE PRECISEZ :			
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : Centre SEDIBEX		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : 1657 98 05	
- INSTALLATION :			
- ADRESSE - TÉLÉPHONE : Le Havre (76)			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies.		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : 2/06/98	
Signature : F. LANGLOIS		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : 20 TONNES	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : 337 541 917 000 29	
DÉNOMINATION : COLIDEC SA		RESPONSABLE : M. Jacques DUMAS	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99			
STOCKAGE	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature : P. Cohen		DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : 3.06.98
<input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage			QUANTITÉ TRANSPORTÉE : 20 TONNES
<input checked="" type="checkbox"/> NON			

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : 30306760700026	
DÉNOMINATION : SEDIBEX Centre SEDIBEX		RESPONSABLE : M. JC FAUQUANT	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Industrielle Portuaire du Havre 76430 SANDAUVILLE L'Écluse Tel: 02.32.79.54.18 SandaUVille		CODE FILIERE A.F.B. :	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET :	<input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT	<input type="checkbox"/> REGROUPEMENT	<input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ
<input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION	<input type="checkbox"/> DÉTOXICATION	<input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE	
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT :			
- DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT :		- DESTINATION FINALE DU DÉCHET	
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature :	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : 03/06/1998	
MOTIFS :		QUANTITÉ RECUE : 24 040 TONNES	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 6 et 24 - 3° de la Loi N° 75 633 du 15.7.75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le Collecteur-transporteur





# BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

7

509. phil

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : <b>GAZ DE FRANCE</b>		RESPONSABLE : <b>M. LE SAUX</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>BAYONNE (64)</b>			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : <b>gachons et emballages saillies par des gachons</b>	CODE NOMENCLATURE : <b>3021152</b>	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIERE D'ASSIMILATION : <b>3077</b>	N° DE GROUPE <b>90</b>
CONSISTANCE DU DÉCHET : <input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE			
TRANSPORT : <input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> Fûts Nbre : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :			
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : <b>Centre SEDI BEX</b>		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : <b>1657 9805</b>	
- INSTALLATION : <b>Le Havre (76)</b>			
- ADRESSE - TÉLÉPHONE :			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies.		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : <b>2/06/98</b>	
Signature : <b>F. LANGLOIS</b>		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : <b>120 TONNES</b>	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : <b>337 541 917 000 29</b>	
DÉNOMINATION : <b>COLIDEC SA</b>		RESPONSABLE : <b>M. Jacques DUMAS</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99</b>			
STOCKAGE <input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage <input checked="" type="checkbox"/> NON	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature :	DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : <b>04.06.98</b>	
		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : <b>26 TONNES</b>	

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : <b>30368786700026</b>	
DÉNOMINATION : <b>SEDI BEX</b> <b>Centre SEDI BEX</b>		RESPONSABLE : <b>M. JC FAUQUANT</b> <b>M. Thénard</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Industrielle Portuaire du Havre 76430 SANDAUVILLE Tel: 02.32.79.54</b>		MODE FILIERE A.F.D. :	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET : <input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ			
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT : - DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT : - DESTINATION FINALE DU DÉCHET			
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature :	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : <b>04/06/1998</b>	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : <b>23 TONNES 300</b>	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Article 24 - 3° de la Loi N° 75-633 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur



N° 07 0320

## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

8

3525, 0001 -

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : GAZ DE FRANCE		RESPONSABLE : UNAS LE BAUX	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : BAYONNE (64)			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : gachons et remblais saillants par des gachons	CODE NOMENCLATURE : 30.21.52	AU TITRE DU R.T.M.D. MATIÈRE D'ASSIMILATION : 30.77	
CONSISTANCE DU DÉCHET : <input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input checked="" type="checkbox"/> LIQUIDE		N° DE GROUPE : 90	
TRANSPORT : 1-04 <input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITIERNE <input type="checkbox"/> FUTS NRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : 1152-88-05	
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : INSTALLATION 247 221 551 - ADRESSE - TÉLÉPHONE : Le Havre (76)		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : 4/06/98	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies. Signature : FLANGLOIS		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : 220 TONNES	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : 337 541 917 000 29	
DÉNOMINATION : COLIDEC SA		RESPONSABLE : M. Jacques DUMAS	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99			
STOCKAGE : <input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage <input checked="" type="checkbox"/> NON		DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : 06-06-98	
Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature : [Signature]		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : 220 TONNES	

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : 33350706700026	
DÉNOMINATION : SERBES DIBEX		RESPONSABLE : M. JC FAUQUANT	
ADRESSE : Rue de l'Industrie de la Semoule du Havre 76430 SANDOUILLE Tél: 02.32.79.54.10		N° FILIÈRE A.F.D. : [ ]	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET : <input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> DETOXICATION <input type="checkbox"/> DESGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ		MISE EN DÉCHARGE	
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT : - DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT :		- DESTINATION FINALE DU DÉCHET : 09/06/1998	
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature : [Signature]	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE :	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : 25 040 TONNES	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24 - 3° de la Loi N° 75-633 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur

Autocopiant Afnor VII 50 g 3 60





07 0320

# BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

4052 - palmaris

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : <b>GAZ DE FRANCE</b>		RESPONSABLE : <b>M. LE SAUX</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>BAYONNE (64)</b>			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : <b>gauchons et remblais saillies par des gauchons</b>		CODE NOMENCLATURE <b>30 2 1 3 2</b>	AU TITRE DU R.T.M.D. MATIÈRE D'ASSIMILATION : <b>30 77</b>
		N° DE GROUPE <b>30</b>	
CONSISTANCE DU DÉCHET :		<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE	
TRANSPORT :		<input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> Fûts MBRE : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :	
MODE D'ÉLIMINATION FINALE : <b>Centre SEDI BEX</b>		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : <b>1657 98 05</b>	
INSTALLATION : <b>Le Havre (76)</b>			
ADRESSE - TÉLÉPHONE :			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies.			
Signature : <b>F. LANGLOIS</b>		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : <b>4/06/98</b>	
		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : <b>2 20 TONNES</b>	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : <b>337 541 917 000 29</b>	
DÉNOMINATION : <b>COLIDEC SA</b>		RESPONSABLE : <b>M. Jacques DUMAS</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99</b>			
STOCKAGE <input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage		DATE DE REMISE À L'ÉLIMINATEUR : <b>8-6-98</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NON		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : <b>2 0 TONNE</b>	
Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature :			

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : <b>30368786700026</b>	
DÉNOMINATION : <b>SEDI BEX</b>		RESPONSABLE : <b>M. JC FAUQUANT</b>	
ADRESSE : <b>Rue Industrielle Sandouville du HAVRE</b>		CODE FILIÈRE A.F.D. :	
TÉLÉPHONE : <b>76430 SANDOUVILLE</b>			
TÉLEX : <b>Tel: 02 32 79 54 10</b>			
OPÉRATION SUR LE DÉCHET : <input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION		<input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE	
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT : — DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT : — DESTINATION FINALE DU DÉCHET			
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :		Signature :	
MOTIFS :		DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : <b>09/06/1998</b>	
		QUANTITÉ REÇUE : <b>25 TONNE 200</b>	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 3 et 24 - 3° de la Loi N° 75-033 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur

Ministère chargé de l'Environnement



N° 07 0320

## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

4541 JL 33

patrick

10

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : GAZ DE FRANCE		RESPONSABLE : M. LE SAUX	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : BAYONNE (64)			
DESIGNATION DU DÉCHET : gachons et remblais saillies par les gachons	CODE NOMENCLATURE : 3021152	MATIERE D'ASSIMILATION : 3077	N° DE GROUPE : 30
CONSISTANCE DU DÉCHET :	<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE	<input type="checkbox"/> BOUES	<input type="checkbox"/> LIQUIDE
TRANSPORT :	<input checked="" type="checkbox"/> BENNE	<input type="checkbox"/> CITERNE	<input type="checkbox"/> FÛTS NBR : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : centre SEDIBEX		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : 1657 98 05	
- INSTALLATION : Le Haue (76)			
- ADRESSE - TÉLÉPHONE :			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45 et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies.		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : 05/06/98	
Signature : F. LANGLOIS		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : 20 TONNES	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : 337 541 917 000 29	
DÉNOMINATION : COLIDEC SA		RESPONSABLE : M. Jacques DUMAS	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99			
STOCKAGE	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus.	DATE DE REMISE A L'ELIMINATEUR :	
<input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage	Signature : P. Lohan	8 06 98	
<input checked="" type="checkbox"/> NON		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : 20 TONNES	

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : 33368786700026	
DÉNOMINATION : SEDIBEX		RESPONSABLE : M. JC FAUQUANT	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : Centre SEDIBEX Rue Industrielle Portuaire du Haue 76430 SANDAUVILLE Tél: 02.32.79.34.10		CODE FILIÈRE A.F.B. :	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET :	<input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT	<input type="checkbox"/> REGROUPEMENT	<input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ
<input type="checkbox"/> VALORISATION	<input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION	<input type="checkbox"/> DÉTOXICATION	<input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT :		DESTINATION FINALE DU DÉCHET	
- DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT :		09/06/1998	
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature :	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE :	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : 23 960 TONNES	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24 3° de la Loi N° 75-633 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur

TOTAL PAGE(S) 10





N° 07 0320

## BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

5619 - prod.

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET :	
DÉNOMINATION : <b>GAZ DE FRANCE</b>		RESPONSABLE : <b>M. Le Saux</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>BAYONNE (64)</b>			
DÉSIGNATION DU DÉCHET : <b>gachons et semblaix sautillés par des gachons</b>	CODE NOMENCLATURE : <b>382152</b>	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION : <b>3077</b>	N° DE GROUPE : <b>90</b>
CONSISTANCE DU DÉCHET : <input checked="" type="checkbox"/> SOLIDE <input type="checkbox"/> BOUES <input type="checkbox"/> LIQUIDE			
TRANSPORT : <input checked="" type="checkbox"/> BENNE <input type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> Fûts Nbre : <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ :			
- MODE D'ÉLIMINATION FINALE : <b>Centre SEDIBEX</b>		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE : <b>1653 9805</b>	
- INSTALLATION : <b>Le Havre (76)</b>			
- ADRESSE - TÉLÉPHONE :			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies.			
Signature : <b>F. LANGLOIS</b>		DATE DE REMISE AU TRANSPORT : <b>05/06/98</b>	
		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT : <b>220 TONNES</b>	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET : <b>337 541 917 000 29</b>	
DÉNOMINATION : <b>COLIDEC SA</b>		RESPONSABLE : <b>M. Jacques DUMAS</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99</b>			
STOCKAGE : <input type="checkbox"/> OUI Lieu de stockage	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature :	DATE DE REMISE A L'ÉLIMINATEUR : <b>8-6-98</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NON		QUANTITÉ TRANSPORTÉE : <b>20 TONNE</b>	

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET : <b>50568780700020</b>	
DÉNOMINATION : <b>Centre SEDIBEX</b>		RESPONSABLE : <b>M. JC FAUQUANT</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX : <b>Route Industrielle Portuaire du Havre 76430 SANDOUVILLE Tel: 02.32.79.54.10</b>		CODE FILIÈRE A.F.D. :	
OPÉRATION SUR LE DÉCHET : <input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> DETOXICATION <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ			
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET :			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT : - DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT : - DESTINATION FINALE DU DÉCHET			
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE :	Signature :	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE : <b>09/06/1998</b>	
MOTIFS :		QUANTITÉ REÇUE : <b>30 640 TONNE</b>	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 24 et 24-3° de la Loi N° 75-633 du 15-7-75


EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le collecteur-transporteur


**cerfa**  
N° 07 0320

# BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS INDUSTRIELS

70764K33 André

<b>1 PRODUCTEUR</b>		N° SIRET:	
DÉNOMINATION: <b>GAZ DE FRANCE</b>		RESPONSABLE: <b>M. Le Saux</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX: <b>BAYONNE (64)</b>			
DÉSIGNATION DU DÉCHET: <b>eaux fortement saumées par des Hydrocarbures</b>	CODE NOMENCLATURE: <b>1501152</b>	AU TITRE DU R.T.M.D.	
		MATIÈRE D'ASSIMILATION: <b>3082</b>	N° DE GROUPE: <b>30</b>
CONSISTANCE DU DÉCHET:	<input type="checkbox"/> SOLIDE <input checked="" type="checkbox"/> BOUES <input checked="" type="checkbox"/> LIQUIDE		
TRANSPORT:	<input type="checkbox"/> BENNE <input checked="" type="checkbox"/> CITERNE <input type="checkbox"/> Fûts Nb: <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ:		
MODE D'ÉLIMINATION FINALE: <b>Centre SEDI BEX</b>		N° DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE: <b>115-3805</b>	
INSTALLATION: <b>Le Havre (76)</b>			
ADRESSE, TÉLÉPHONE:			
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, que les matières sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 16.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies.			
Signature: <b>F. LANGLOIS</b>		DATE DE REMISE AU TRANSPORT: <b>08.06.98</b>	
		QUANTITÉ REMISE AU TRANSPORT: <b>210 TONNES</b>	

<b>2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR</b>		N° SIRET: <b>337 541 917 000 29</b>	
DÉNOMINATION: <b>COLIDEC SA</b>		RESPONSABLE: <b>M. Jacques DUMAS</b>	
ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLEX: <b>Rue Goya BP 37 33530 BASSENS Tél.: 05.56.74.26.99</b>			
STOCKAGE:	Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, Signature: 	DATE DE REMISE À L'ÉLIMINATEUR: <b>8.06.98</b>	
<input type="checkbox"/> OUI: Lieu de stockage		QUANTITÉ TRANSPORTÉE: <b>10 TONNE</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NON			

<b>3 DESTINATAIRE</b>		N° SIRET: <b>30308786700026</b>	
DÉNOMINATION: <b>Centre SEDI BEX</b>		RESPONSABLE: <b>M. JC FAUQUANT</b>	
ADRESSE: <b>Route Industrielle Portuaire du Havre</b>		CODE FILIÈRE A.F.I.: <b>25</b>	
TÉLÉPHONE: <b>76430 SAINTE-VALLE - SAINTE-VALLE</b>			
TÉLEX: <b>Tel: 02.32.79.54.10</b>			
OPÉRATION SUR LE DÉCHET:		<input type="checkbox"/> PRÉTRAITEMENT <input type="checkbox"/> REGROUPEMENT <input type="checkbox"/> AUTRE PRÉCISEZ	
<input type="checkbox"/> VALORISATION <input checked="" type="checkbox"/> INCINÉRATION <input type="checkbox"/> DÉTOXICATION <input type="checkbox"/> MISE EN DÉCHARGE			
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DÉCHET:			
EN CAS DE PRÉTRAITEMENT:			
- DESCRIPTION DU PRÉTRAITEMENT:		- DESTINATION FINALE DU DÉCHET:	
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE:	Signature: 	DÉCHETS PRIS EN CHARGE LE: <b>09/06/1998</b>	
MOTIFS:		QUANTITÉ REÇUE: <b>6 020 TONNE</b>	

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Art. 17 - 3° de la Loi n° 75-633 du 15-7-75

EXEMPLAIRE N° 2 - A conserver par le destinataire
